配电系统维保所需基本资料清单

序号	所需资料	主要包含内容	资料有无	完成时间	完成人	备注
1	整个配电系统图纸					
2	配电网络拓扑图	包含所维保的全部设备线路				
3	配电系统基础信息	总信息表				总台账
4	配电箱具体基础信息	系统图、配电箱图片（箱门、箱内）各回路的信息				各个配电箱的分台账
5	管内重点场所电气维保记录	维保内容、维保小结、病害及处置记录表、病害处置前后对比图（重点病害位置、病害部位、处置办法、以及完整的横排照片）、维护保养过程图片（有盯控人员、照片要合乎安全操作规范）				每个站房、配电室一份，分为月检、季检、年检
6	电气设备维护保养记录表	配电室一份，配电箱每个一份				月检、季检、年检
7	应急抢修记录表	抢修情况要写明抢修时间及过程，后面要有病害位置照片和抢修过程照片，4-8 张最好（有盯控人员，操作合规）				

各种附件：

1、配电系统基础信息表

_____站房配电系统台账

序号	配电箱名称	安装位置	配电箱材质、尺寸	配电箱安装方式	进线来源及规格	总空开规格型号	控制回路数	照明开关型号、数量	插座开关型号、数量	外单位用电情况

2、照明配电系统基础信息表

照明配电系统维保记录

维保地点：_____

维保时间：_____年____月

_____照明配电系统维保记录（ZMPD-1）

维保地点				配电箱编号			
配电系统	_____相_____线			工作电压			___V、___V、___V
维保时间	_____年____月____日			检测人员（签名）			
验收（签名）				监护人员（签名）			
电器元件	**单位**	**数量**	**厂家/型号**	**额定电流**	**启动电流**	**运行电流**	**技术状态**
电源总开关							
电流互感器							
电流表							
照明开关 1 型							
照明开关 2 型							
插座开关/漏保 1 型							
插座开关/漏保 2 型							
插座开关/漏保 3 型							
其它单位断路器 1							
其它单位断路器 2							

检测维保记录					
检测项目	状态	检测项目	状态	检测项目	状态
A-地绝缘电阻	MΩ	A-启动电流	A	A-运行电流	A
B-地绝缘电阻	MΩ	B-启动电流	A	B-运行电流	A
C-地绝缘电阻	MΩ	C-启动电流	A	C-运行电流	A
N-PE 电阻	Ω	N-启动电流	A	N-运行电流	A
A-B 绝缘电阻	MΩ	A-C 绝缘电阻	MΩ	B-C 绝缘电阻	MΩ
PE 接地电阻	Ω	系统图		箱内配线	
避雷保护装置		编号标识		接线端子	
配电箱密封		电缆标牌		穿管配线	
配电箱门锁		清灰保洁		线槽配线	

_____照明配电系统（ZMPD-2）

<table>
<tr><td>安装地点</td><td></td><td>配电箱编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">供电系统图（含回路编号、额定电流、导线规格、用电设备名称、安装位置等信息）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">说明：</td></tr>
</table>

_____照明配电系统维保记录（ZMPD-3）

维保地点		配电箱编号	
检测时间		检测人员（签名）	
验收（签名）		监护人员（签名）	

电源总开关型号	额定电流	导线截面	电源电压	A 相		B 相		C 相		零线		备注
				启动电流	运行电流	启动电流	运行电流	启动电流	运行电流	启动电流	运行电流	

序号	供电回路	开关型号	额定电流	导线截面	电源电压	启动电流	运行电流	功率	用电设备	设备地点	备注

_____照明配电系统维保记录（ZMPD-4）

<table>
<tr><td colspan="2">维保地点</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">配电箱编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">电流互感器</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>规格型号</td><td>数量</td><td colspan="2">状态</td><td>规格型号</td><td>生产厂家</td><td>使用单位</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>规格型号</td><td>数量</td><td colspan="2">状态</td><td>规格型号</td><td>数量</td><td>状态</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>规格型号</td><td>数量</td><td colspan="2">状态</td><td>规格型号</td><td>数量</td><td>状态</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">照明配电箱内向其它单位（含大功率电器）设备供电情况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>供电回路</td><td>开关型号</td><td>导线截面</td><td>功率</td><td>用电设备</td><td>设备地点</td><td>状态</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">说明：</td></tr>
</table>

_____照明配电系统病害处置记录（ZMPD-5）

检测时间			检测人员（签名）		
验收（签名）			监护人员（签名）		
序号	维保项目	病害及缺陷描述	单位	数量	处置方法

3、电气设备维护保养记录表

大同房建公寓段
管内重点场所电气设备维护保养记录

维保地点：_阳高南站_

维保时间：_2025_年_7_月

大同房建公寓段

管内重点场所电气设备维护保养工作记录表（PDWB-1）

<table>
<tr><td>维保地点</td><td>阳高南站站房</td><td>维保时间</td><td>2025 年__7__月</td></tr>
<tr><td>盯控人员</td><td></td><td>维保人员</td><td></td></tr>
<tr><td>维保工作内容</td><td colspan="3">根据大同房建公寓段重点场所电器设备维护保养合同约定，于七月对阳高南站完成月度维保工作，具体维保工作内容如下：
1.对 17 台照明动力配电箱外观检查：核查标识是否齐全，确认设备编号标识与供电系统图对应一致；检查箱门门锁是否完好且处于锁闭状态，确保密封性能良好。
2.对 17 台照明动力配电箱内元器件进行检查：查看柜内（含通风孔）有无尘垢，设备工作时是否存在异常噪音与气味；检查各种指示灯是否能准确显示工作状态，元器件外观是否完好、排列是否整齐、附件是否齐全且无残缺破损。
3.对 17 台照明动力配电箱内元器件的安装规范情况进行检查：确认电气安全距离符合标准要求，不同极性带电裸露部分的电气间隙处于安全范围；检查电器元件安装是否牢靠、附件是否齐全、减震措施是否完备，确保其不承受额外应力。
4.对 17 台照明动力配电箱内配线实施检查：查看接线端子有无锈蚀、变色、发热及烧损现象，确认无遗留可能带电的导线及裸露端子；检查配电设备门是否有接地跨接等。
5.对 17 台照明动力配电箱进行清灰、螺丝紧固、成像仪温度测量，并对相关病害进行处置。
6.对 4 个站名字的钢结构底架进行检查：查看底架是否稳固，有无锈蚀、裂缝等问题。
7.对 4 个站名字的发光字开展检查：检查 LED 发光字的运行状态，包括亮度、色彩、清晰度等方面。
8.对 4 个站名字的 LED 电源进行检测：查看其工作状态，测量进线和出线的电流、电压。
9.对检查中发现的病害及不符合相关规范之处已进行整改。
10.具体维保详情可参见维保记录及病害记录。</td></tr>
<tr><td>维保工作小结</td><td colspan="3">根据合同约定，阳高南站七月月度维保工作已顺利完成，现将具体维保工作情况小结如下：
本次维保工作涵盖 17 台照明动力配电箱和 4 个站名字相关设施等重点设备。针对 17 台照明动力配电箱，依次开展了外观检查，核查标识齐全性及与供电系统图的对应性，确保箱门门锁完好、锁闭且密封良好；对箱内元器件进行外观检查，查看柜内（含通风孔）有无尘垢，设备工作时是否存在异常噪音与气味，以及指示灯显示准确性、元器件外观与排列状况等；检查元器件安装规范，确认电气安全距离、带电裸露部分间隙符合标准；实施配线检查，查看接线端子状态，确保无遗留带电导线及裸露端子，同时检查配电设备门接地跨接情况。此外，还对这些配电箱进行了清灰、螺丝紧固、成像仪温度测量，并处置了相关病害。对于 4 个站名字的钢结构底架，检查其是否稳固，有无锈蚀、裂缝等问题；对站名字发光字，检查 LED 发光字的亮度、色彩、清晰度等运行状态；针对 LED 电源，检测其工作状态。同时对检查过程中发现的病害及不符合相关规范之处，均已及时进行整改。
本次维保实现了对阳高南站 17 台照明动力配电箱及 4 个站名字等房建设备的正常运行保障，达到了预期的工作目标。</td></tr>
</table>

大同房建公寓段

管内重点场所电气设备病害及处置记录表（PDWB-2）

序号	病害位置	病害及缺陷描述	数量	处置方法	备注
1	四个站名字配电箱	配电箱内灰尘大	4处	清扫配电箱内灰尘	已处理
2	四个站名字配电箱	配电箱门无接地线	4处	安装4平方黄绿地线	下次月检处理
3	四个站名字配电箱	配电箱内底板有孔洞	4处	使用防火材料封堵	下次月检处理
4	四个站名字配电箱	配电箱生锈老旧	4台	更换配电箱	未处理
5	四个站名字配电箱	配电箱箱内空开未固定	4处	固定箱内空开	下次月检处理
6	四个站名字配电箱	配电箱门无警示标签	4台	粘贴警示标签	已处理
7	二楼东侧配电室二层东侧照明配电箱	配电箱内有灰尘	1处	清扫配电箱内灰尘	已处理
8	二楼东侧配电室二层东侧照明配电箱	配电箱地排与箱门使用扁铜线，不符合要求	1处	更换4平方黄绿地线	下次月检处理
9	二楼东侧配电室二层东侧照明配电箱	配电箱警示标签老旧	1处	更换新的警示标签	已处理
10	一楼东侧配电室 一层东侧照明配电箱，售票厅照明配电箱	配电箱内有灰尘	2处	清扫配电箱内灰尘	已处理
11	一楼东侧配电室 一层东侧照明配电箱，售票厅照明配电箱	配电箱地排与箱门使用扁铜线，不符合要求	2处	更换4平方黄绿地线	下次月检处理
12	二楼西侧配电室 二层西侧照明配电箱，空气源1号、2号配电箱	配电箱内灰尘大	3处	清扫配电箱内灰尘	已处理
13	二楼西侧配电室 二层西侧照明配电箱，空气源1号、2号配电箱	配电箱地排与箱门使用扁铜线，不符合要求	3处	更换4平方黄绿地线	下次月检处理
14	二楼西侧配电室 二层西侧照明配电箱，空气源1号、2号配电箱	配电箱底部有孔洞	3处	使用防火材料封堵	下次月检处理
15	一楼西侧配电室 一层西侧照明配电箱，候车大厅照明1号、2号配电箱	配电箱内有灰尘	3处	清扫配电箱内灰尘	已处理
16	一楼西侧配电室 一层西侧照明配电箱，候车	配电箱地排与箱门使用扁铜线，不符合要求	3处	更换4平方黄绿地线	下次月检处理

序号	病害位置	病害及缺陷描述	数量	处置方法	备注
	大厅照明1号、2号配电箱				
17	进站地道直梯配电室地下通道照明1号、2号配电箱，雨棚照明1号、2号配电箱	配电箱内有灰尘	4处	清扫配电箱内灰尘	已处理
18	进站地道直梯配电室地下通道照明1号、2号配电箱，雨棚照明1号、2号配电箱	配电箱地排与箱门使用扁铜线，不符合要求	4处	更换4平方黄绿地线	下次月检处理
19	站名字电源线管老化	站房房顶（四个站名字）	4处	建议更换电源线管	未处理

大同房建公寓段

管内重点场所电气设备病害处置前后对比图（PDWB-3）

病害位置及图片：	
病害说明：	配电箱箱门警示标签老旧
处置后图片：	
处置说明：	更换新的箱门警示标签

病害位置及图片：	
病害说明：	四台站名字配电箱 生锈老旧 ， 需要更换配电箱
病害位置及图片：	
病害说明：	站名字南字配电箱空开未固定

病害位置及图片：	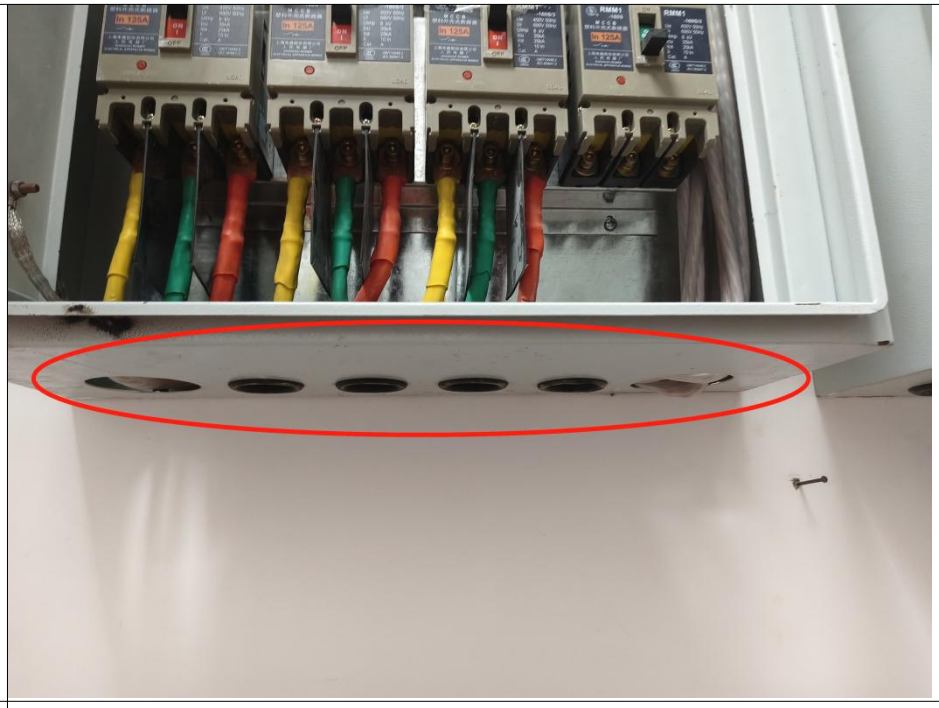
病害说明：	配电箱底部有孔洞

大同房建公寓段

管内重点场所电气设备维护保养过程图片（PDWB-4）

4、电气维保月检、季检、年检记录表

（1）站房月检表

_____ 站房电气设备维护保养记录表（___月检）

安装位置：A 区一层客运值班室		配电箱编号：	01		
盯控人员：		维保人员：			
一、配电箱（柜）外观检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）周围有无杂物	周围无杂物	无	正常	
2	防触电警示标识是否完好	警示标识完好	完好	正常	
3	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好	完好	正常	
4	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好	良好	正常	
5	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘	有	正常	已清理
6	配电箱（柜）内有无异响、异味	无异响和异味	无	正常	
7	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐	整齐	正常	
8	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致	一致	正常	
9	配电箱内电线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味	无	正常	
10	配电箱（柜）内零排安装是否稳固，有无 N 标识	安装稳固，有 N 标识	稳固，有标识	正常	
11	零排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	无	正常	
12	配电箱（柜）内地排安装是否稳固，有无 PE 标识	内地排安装是否稳固，有无 PE 标识	有标识	正常	
13	地排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	无两根以上	正常	
14	地排与箱体是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱体用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	完好	正常	
15	地排与箱门是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱门用不小于 4 平方黄绿铜	完好	正常	

		线紧固连接			
16	配电箱内元器件是否外观完好，排列整齐，附件齐全	元器件外观完好，排列整齐，附件齐全	完好，齐全	正常	
17	配电箱内是否遗留有可能带电的导线及裸露端子	配电箱内无遗留有可能带电的导线及裸露端子	无	正常	
18	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙是否在安全范围内	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙在安全范围内	无	正常	
19	配电箱内电气元件是否在安全范围内	配电箱内电气元件在安全范围内	安全范围内	正常	
20	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象	无	正常	
21	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常	无指示灯	正常	
22	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵	已封堵	正常	
23	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片	无塑壳断路器	正常	
二、配电箱（柜）系统图检查					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	设备编号标识是否与系统图对应一致	设备编号标识是否与系统图对应一致	不一致	否	下次更换
2	配电箱（柜）系统图与上次检查是否一致		不一致	否	下次更换
三、站名字检查					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	站名字发光是否均匀无瞎点	发光均匀无瞎点	无瞎点	无瞎点	
2	站名字亚克力板是否变形开裂	无变形开裂	无变形开裂	无变形开裂	
3	站名字整体结构是否结实可靠	整体结构结实可靠	结实可靠	结实可靠	
4	站名字电线路是否有发热老化开裂现象	连接部位无松动、缺失	线盒盖缺失		
四、检查与维护维保					

序号	检查内容	检查标准	结果及数据	是否正常	备注
1	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
2	紧固电线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	接头紧固			
3	红外测试仪测量电缆、接头、是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
4	红外测试仪测量箱内元器件是否有过热现象	元器件无过热现象			
5	核对电压表、电流表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	缺失或新增标识补充				
7	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			

（2）站房季检表

_____ 站房电气设备维护保养记录表（___季检）

安装位置：		配电箱编号：			
盯控人员：		维保人员：			
一、配电箱（柜）外观检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）周围有无杂物	周围无杂物			
2	防触电警示标识是否完好	警示标识完好			
3	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好			
4	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好			
5	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘			
6	配电箱（柜）内有无异响、异味	无异响和异味			
7	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐			
8	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致			
9	配电箱内电线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味			
10	配电箱（柜）内零排安装是否稳固，有无 N 标识	安装稳固，有 N 标识			
11	零排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线			
12	配电箱（柜）内地排安装是否稳固，有无 PE 标识	内地排安装是否稳固，有无 PE 标识			
13	地排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线			
14	地排与箱体是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱体用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接			
15	地排与箱门是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱门用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接			
16	配电箱内元器件是否外观完好，排列整齐，附件齐全	元器件外观完好，排列整齐，附件齐全			
17	配电箱内是否遗留有可能带电的导线及裸露端子	配电箱内无遗留有可能带电的导线及裸露端子			
18	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙是否在安全范围内	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙			

		在安全范围内			
19	配电箱内电气元件是否在安全范围内	配电箱内电气元件在安全范围内			
20	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象			
21	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常			
22	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵			
23	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片			
二、配电箱（柜）系统图检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	设备编号标识是否与系统图对应一致	设备编号标识是否与系统图对应一致			
2	配电箱（柜）系统图与上次检查是否一致				
三、站名字检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	站名字发光是否均匀无瞎点	发光均匀无瞎点			
2	站名字亚克力板是否变形开裂	无变形开裂			
3	站名字整体结构是否结实可靠	整体结构结实可靠			
4	站名字电线路是否有发热老化开裂现象	连接部位无松动、缺失			
5	站名字电源是否有老化损坏现象	电源无老化损坏			
6	站名字电源安装是否牢靠	安装牢靠			
7	发光二极管之间的导线连接是否稳固无裸露	连接稳固无裸露			
四、照明电线路检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	电线路是否排列整齐，编号是否正确	电线路排列整齐，编号正确			
2	电缆起始段、拐弯处是否悬挂功能齐全的标识牌	悬挂功能齐全的标识牌			
3	电缆内绝缘层颜色与接线火地零一致	颜色与火地零一致			
4	电线电缆绝缘层是否有破损、变色、老化现象	绝缘层无破损、变色、老化			
5	对用电负荷进行核对				

五、电源电缆（含接箱）的检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	电线路是否排列整齐，编号是否正确	电线路排列整齐，编号正确			
2	电缆起始段、拐弯处是否悬挂功能齐全的标识牌	悬挂功能齐全的标识牌			
3	电缆内绝缘层颜色与接线火地零一致	颜色与火地零一致			
4	电线电缆绝缘层是否有破损、变色、老化现象	绝缘层无破损、变色、老化			
5	电缆端子连接是否紧固无变色	连接紧固无变色			
六、电缆桥架、线管的检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	桥架线管是否有变形、锈蚀、涂层脱落	变形、锈蚀、涂层脱落			
2	桥架连接部位是否松动或缺失	无松动或缺失			
3	桥架线管接地线是否完好	接地线完好			
4	桥架线管内有无杂物，如有则清理				
5	桥架线管支架系统、管卡螺栓紧固或更换				
6	桥架、线管涂层脱落处的喷漆保养				
七、检查与维护维保					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
2	紧固电线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	接头紧固			
3	红外测试仪测量电缆、接头、是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
4	红外测试仪测量箱内元器件是否有过热现象	元器件无过热现象			
5	核对电压表、电流表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	对电线缆的运行温度进行测量				
7	对电线电缆的绝缘阻值进行测量				
8	缺失或新增标识补充				
9	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			

（3）站房年检表

_____ 站房电气设备维护保养记录表（年检）

安装位置：	配电箱编号：	
盯控人员：	维保人员：	

一、配电箱（柜）外观检查

序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）周围有无杂物	周围无杂物			
2	防触电警示标识是否完好	警示标识完好			
3	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好			
4	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好			
5	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘			
6	配电箱（柜）内有无异响、异味	无异响和异味			
7	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐			
8	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致			
9	配电箱内电线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味			
10	配电箱（柜）内零排安装是否稳固，有无 N 标识	安装稳固，有 N 标识			
11	零排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线			
12	配电箱（柜）内地排安装是否稳固，有无 PE 标识	内地排安装是否稳固，有无 PE 标识			
13	地排同一个接线端子最多并接俩根同线径导线	同一个接线端子最多并接俩根同线径导线			
14	地排与箱体是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱体用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接			
15	地排与箱门是否用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接	地排与箱门用不小于 4 平方黄绿铜线紧固连接			
16	配电箱内元器件是否外观完好，排列整齐，附件齐全	元器件外观完好，排列整齐，附件齐全			
17	配电箱内是否遗留有可能带电的导线及裸露端子	配电箱内无遗留有可能带电的导线及裸露端子			

18	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙是否在安全范围内	配电箱内不同极性带电裸露部分电气间隙在安全范围内			
19	配电箱内电气元件是否在安全范围内	配电箱内电气元件在安全范围内			
20	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象			
21	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常			
22	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵			
23	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片			
二、配电箱（柜）系统图检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	设备编号标识是否与系统图对应一致	设备编号标识是否与系统图对应一致			
2	配电箱（柜）系统图与上次检查是否一致				
三、站名字检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	站名字发光是否均匀无瞎点	发光均匀无瞎点			
2	站名字亚克力板是否变形开裂	无变形开裂			
3	站名字整体结构是否结实可靠	整体结构结实可靠			
4	站名字电线路是否有发热老化开裂现象	连接部位无松动、缺失			
5	站名字电源是否有老化损坏现象	电源无老化损坏			
6	站名字电源安装是否牢靠	安装牢靠			
7	发光二极管之间的导线连接是否稳固无裸露	连接稳固无裸露			
8	站字电流电压的测量				
四、照明电线路检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	电线路是否排列整齐，编号是否正确	电线路排列整齐，编号正确			
2	电缆起始段、拐弯处是否悬挂功能齐全的标识牌	悬挂功能齐全的标识牌			

3	电缆内绝缘层颜色与接线火地零一致	颜色与火地零一致			
4	电线电缆绝缘层是否有破损、变色、老化现象	绝缘层无破损、变色、老化			
5	对用电负荷进行核对				
五、电源电缆（含接箱）的检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	电线路是否排列整齐，编号是否正确	电线路排列整齐，编号正确			
2	电缆起始段、拐弯处是否悬挂功能齐全的标识牌	悬挂功能齐全的标识牌			
3	电缆内绝缘层颜色与接线火地零一致	颜色与火地零一致			
4	电线电缆绝缘层是否有破损、变色、老化现象	绝缘层无破损、变色、老化			
5	电缆端子连接是否紧固无变色	连接紧固无变色			
六、电缆桥架、线管的检查与维护保养					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	桥架线管是否有变形、锈蚀、涂层脱落	变形、锈蚀、涂层脱落			
2	桥架连接部位是否松动或缺失	无松动或缺失			
3	桥架线管接地线是否完好	接地线完好			
4	桥架线管内有无杂物，如有则清理				
5	桥架线管支架系统、管卡螺栓紧固或更换				
6	桥架、线管涂层脱落处的喷漆保养				
七、站台灯具接线盒					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	灯具接线盒内电线接头是否松动、完好	电线接头无松动、完好			
2	灯具悬挂或安装支架是否牢固	灯具悬挂或安装支架牢固			
3	灯具接线盒内是否有积水、灰尘	接线盒内无积水、灰尘			
4	清理灯具内杂物				

5	接线盒是否变形、锈蚀，螺栓是否缺失	无变形、锈蚀			
6	相关病害的处理				
八、检查与维护维保					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
2	紧固电线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	接头紧固			
3	红外测试仪测量电缆、接头、是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
4	红外测试仪测量箱内元器件是否有过热现象	元器件无过热现象			
5	核对电压表、电流表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	对电线缆的运行温度进行测量				
7	对电线电缆的绝缘阻值进行测量				
8	缺失或新增标识补充				
9	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			

（4）配电室月检表

_____ 低压配电室维护保养记录表（月检）

一、配电室环境检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室室内温度	温度≤40℃			
2	配电室室内湿度	湿度≤80℃			
3	配电室内有无漏水、积水	室内确保无漏水、无积水			
4	室内有无虫鼠害隐患	室内无虫鼠害			
5	消防器材数量是否充足	配备干粉与 CO_2 灭火器			
6	灭火器是否能正常使用	指针在绿区			
7	烟雾报警器是否完好	完好			
8	照明和应急照明功能是否正常	功能正常			
9	配电室内标识是否齐全清晰	警示标识清晰			
10	挡鼠板是否完整结实	完整结实高度大于等于60CM			
11	配电室内是否有孔洞	配电室内无孔洞			
二、配电设备外观检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好			
2	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好			
3	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘			
4	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐			
5	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致			
6	配电柜、母线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味			
7	绝缘部件（如绝缘子）套签是否破损、积尘或放电痕迹	绝缘部件无破损、积尘和放电痕迹			
8	配电箱（柜）前的绝缘垫是否符合要求	宽度大于 600mm,长度大于覆盖区域			
9	配电室内接地电阻连接是否可靠，连接点有无锈蚀	连接可靠无锈蚀			

10	继电器、接触器、指示灯等元器件是否烧焦、变色、破损	元器件无烧焦、变色、破损现象			
11	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象			
12	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常			
13	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵			
14	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片			
15	检查柜(箱)内导轨是否安装牢固、水平。是否有固定卡片	导轨安装牢固平直			
16	地排是否与柜门、箱体有黄绿不小于 6 平方导线有效连接	地排与柜门、箱体有黄绿不小于 6 平方导线有效连接			
17	零、地排是否安装牢固，是否有标识	零、地排安装牢固，标识清晰			
18	柜内（包括通风孔）有无尘垢，有无异常噪音和异味。	无异响和异味			
三、配电室相关挂结及平面图与系统图检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室管理制度等相关挂结是否完善	配电室管理制度等相关挂结完善完整			
2	配电室平面图与实际布局是否一致	配电室平面图与实际布局一致			
3	配电箱（柜）系统图与实际布局是否一致	配电箱（柜）系统图与实际布局一致			
四、检查与维护维保					
序号	检查内容	检查标准	结果及数据	是否正常	备注
1	配电室内整体卫生清洁	整体做到干净卫生			做卫生清洁
2	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
3	紧固母线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	母线、接头、端子紧固			
4	红外测试仪、电缆、接头、母线是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
5	核对电压表、电流表、功率因素表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	缺失或新增标识补充	标识齐全完好			
8	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			

五、电缆与线路及桥架线管检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	电缆起始端、拐弯处是否悬挂标识牌	悬挂电缆标识牌			
2	电缆绝缘层无破损、变色、老化和烧损现象	无破损、变色、老化			
3	桥架是否有变形、锈蚀、涂层脱落	桥架无变形、锈蚀、涂层脱落			
4	桥架连接部位是否松动或缺失	连接部位无松动、缺失			
5	桥架接地线是否完好，连接点无锈蚀	接地线完好连接点无锈蚀			
6	桥架周边无积水、油污等物质	周边无积水、油污等物质			
7	桥架盖板是否完好，有无小动物进入	盖板完好无小动物进入			
8	桥架穿墙、穿楼板处的防火封堵是否完好	防火封堵完好			
9	对电线、电缆的运行温度进行测量温度是否正常	温度≤70℃			
六、UPS、EPS 机头、蓄电池的检查维护					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	机头外壳无破损、变形、散热孔无堵塞	外壳无破损、变形、散热孔无封堵			
2	机头指示灯状态正常	指示灯状态正常			
3	电源线、信号线等无松动、氧化	电源线、信号线无松动			
4	检查接地线连接是否可靠	接地线紧固可靠			
5	电池壳体无鼓包、漏液、极柱无腐蚀	电池无鼓包。漏液、极柱无腐蚀			

（5）配电室季检表

_____ 低压配电室维护保养记录表（ __季检）

盯控人员： **维保人员：**

一、配电室环境检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室室内温度	温度≤40℃			
2	配电室室内湿度	湿度≤80℃			
3	配电室内有无漏水、积水	室内确保无漏水、无积水			
4	室内有无虫鼠害隐患	室内无虫鼠害			
5	消防器材数量是否充足	配备干粉与 CO_2 灭火器			
6	灭火器是否能正常使用	指针在绿区			
7	烟雾报警器是否完好	完好			
8	照明和应急照明功能是否正常	功能正常			
9	配电室内标识是否齐全清晰	警示标识清晰			
10	挡鼠板是否完整结实	完整结实高度大于等于60CM			
11	配电室内是否有孔洞	配电室内无孔洞			
二、配电设备外观检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好			
2	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好			
3	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘			
4	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐			
5	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致			
6	配电柜、母线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味			
7	绝缘部件（如绝缘子）套签是否破损、积尘或放电痕迹	绝缘部件无破损、积尘和放电痕迹			
8	配电箱（柜）前的绝缘垫是否符合要求	宽度大于 600mm,长度大于覆盖区域			

9	配电室内接地电阻连接是否可靠，连接点有无锈蚀	连接可靠无锈蚀			
10	配电箱（柜）内元器件外观完好，排列整齐，附件齐全，是否烧焦、变色	元器件外观完好，排列整齐，附件齐全，无烧焦、变色			
11	配电箱（柜）内是否遗留有可能带电的导线及裸露端子	无遗留有可能带电的导线及裸露端子			
12	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象			
13	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常			
14	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵			
15	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片			
16	检查柜(箱)内主开关与辅助开关的通断位置是否一致。	主开关与辅助开关的通断位置一致			
17	配电箱柜内不同极性带电裸露部分电气间隙是否在安全范围内	不同极性带电裸露部分电气间隙在安全范围内			
18	配电箱柜内电气元件是否在安全范围内	电气元件在安全范围内			
19	地排是否与柜门、箱体有黄绿不小于 4 平方导线有效连接	地排与柜门、箱体有黄绿不小于 4 平方导线有效连接			
20	零、地排是否安装牢固，是否有标识	零、地排安装牢固，标识清晰			
21	柜内（包括通风孔）有无尘垢，有无异常噪音和异味。	无异响和异味			
三、配电室相关结挂及平面图与系统图检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室管理制度等相关结挂是否完善	配电室管理制度等相关结挂完善			
2	配电室平面图与上次检查是否一致				
3	配电箱（柜）系统图与上次检查是否一致				
四、检查与维护维保					
序号	检查内容	检查标准	结果及数据	是否正常	备注
1	配电室内整体卫生清洁	整体做到干净卫生			做卫生清洁

2	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
3	紧固母线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	母线、接头、端子紧固			
4	红外测试仪、电缆、接头、母线是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
5	核对电压表、电流表、功率因数表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	缺失或新增标识补充	标识齐全完好			
8	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			
五、电缆与线路及桥架线管检查					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	电缆起始端、拐弯处是否悬挂标识牌	悬挂电缆标识牌			
2	电缆绝缘层无破损、变色、老化和烧损现象	无破损、变色、老化			
3	桥架是否有变形、锈蚀、涂层脱落	桥架无变形、锈蚀、涂层脱落			
4	桥架连接部位是否松动或缺失	连接部位无松动、缺失			
5	桥架接地线是否完好，连接点无锈蚀	接地线完好连接点无锈蚀			
6	桥架周边无积水、油污等物质	周边无积水、油污等物质			
7	桥架盖板是否完好，有无小动物进入	盖板完好无小动物进入			
8	桥架穿墙、穿楼板处的防火封堵是否完好	防火封堵完好			
9	对电线、电缆的运行温度进行测量温度是否正常	温度≤70℃			
10	电线路的绝缘阻值检测				
11	检测电缆的接线端子是否过热、氧化	接线端子无过热、氧化现象			
12	对发现的病害予以处置				
六、UPS、EPS 机头、蓄电池的检查维护					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	机头外壳无破损、变形、散热孔无堵塞	外壳无破损、变形、散热孔无封堵			

2	机头指示灯状态正常	指示灯状态正常			
3	电源线、信号线等无松动、氧化	电源线、信号线无松动			
4	检查接地线连接是否可靠	接地线紧固可靠			
5	电池壳体无鼓包、漏液、极柱无腐蚀	电池无鼓包。漏液、极柱无腐蚀			
6	对机头内部进行清洁				
7	接地电阻测量	≤4 欧			
8	测量电池电压	偏差≤0.2V			
9	自动切换测试	≤0.1S 完成切换			
10	充放电试验				
七、数据检测与记录					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	母线温度测量	温度≤70℃			
2	接地电阻测量	≤4 欧			
3	三相电流不平衡度检测	≤15%			
4	出线端电压测量	允许偏差 7%			
5	剩余电流测量				

（6）配电室年检表

_____ 低压配电室维护保养记录表（年检）

盯控人员： **维保人员：**

一、配电室环境检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室室内温度	温度≤40℃			
2	配电室室内湿度	湿度≤80℃			
3	配电室内有无漏水、积水	室内确保无漏水、无积水			
4	室内有无虫鼠害隐患	室内无虫鼠害			
5	消防器材数量是否充足	配备干粉与 CO_2 灭火器			
6	灭火器是否能正常使用	指针在绿区			
7	烟雾报警器是否完好	完好			
8	照明和应急照明功能是否正常	功能正常			
9	配电室内标识是否齐全清晰	警示标识清晰			
10	挡鼠板是否完整结实	完整结实高度大于等于60CM			
11	配电室内是否有孔洞	配电室内无孔洞			
二、配电设备外观检查					
序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电箱（柜）门锁是否完好	门锁完好			
2	配电箱（柜）箱体有无锈蚀变形情况，柜门是否密封良好	箱体无锈蚀变形，柜门密封良好			
3	配电箱（柜）内是否有灰土积尘	无积土灰尘			
4	配电箱（柜）内配线是否整齐	配线整齐			
5	配电箱（柜）内标识是否齐全一致	标识齐全一致			
6	配电柜、母线、电缆接头有无过热、变色、变形、异味	接头无过热、变色变形、异味			
7	绝缘部件（如绝缘子）套签是否破损、积尘或放电痕迹	绝缘部件无破损、积尘和放电痕迹			
8	配电箱（柜）前的绝缘垫是否符合要求	宽度大于 600mm,长度大于覆盖区域			

9	配电室内接地电阻连接是否可靠，连接点有无锈蚀	连接可靠无锈蚀			
10	配电箱（柜）内元器件外观完好，排列整齐，附件齐全，是否烧焦、变色	元器件外观完好，排列整齐，附件齐全，无烧焦、变色			
11	配电箱（柜）内是否遗留有可能带电的导线及裸露端子	无遗留有可能带电的导线及裸露端子			
12	二次接线是否整齐、有无绝缘老化。断裂或接触不良	排线整齐无老化。断裂现象			
13	指示灯，仪表显示是否正常	指示灯、仪表等正常			
14	配电箱（柜）进出线是否防火封堵	进出线处做好防火封堵			
15	塑壳断路器是否有隔弧挡片	必须有隔弧片			
16	检查柜(箱)内主开关与辅助开关的通断位置是否一致。	主开关与辅助开关的通断位置一致			
17	配电箱柜内不同极性带电裸露部分电气间隙是否在安全范围内	不同极性带电裸露部分电气间隙在安全范围内			
18	配电箱柜内电气元件是否在安全范围内	电气元件在安全范围内			
19	地排是否与柜门、箱体有黄绿不小于 4 平方导线有效连接	地排与柜门、箱体有黄绿不小于 4 平方导线有效连接			
20	零、地排是否安装牢固，是否有标识	零、地排安装牢固，标识清晰			
21	柜内（包括通风孔）有无尘垢，有无异常噪音和异味。	无异响和异味			

三、配电室相关结挂及平面图与系统图检查

序号	检查内容	检查标准	检查结果	是否正常	备注
1	配电室管理制度等相关结挂是否完善	配电室管理制度等相关结挂完善			
2	配电室平面图与上次检查是否一致				
3	配电箱（柜）系统图与上次检查是否一致				

四、检查与维护维保

序号	检查内容	检查标准	结果及数据	是否正常	备注
1	配电室内整体卫生清洁	整体做到干净卫生			做卫生清洁

2	配电箱（柜）内除尘清洁	配电箱（柜）内无积土灰尘			
3	紧固母线、电缆接头、接头端子、螺栓紧固	母线、接头、端子紧固			
4	红外测试仪、电缆、接头、母线是否有过热现象	测试点的温度符合要求规范			
5	核对电压表、电流表、功率因数表等显示是否正确	各种仪表正常			
6	缺失或新增标识补充	标识齐全完好			
8	发现零小病害的现场整治	病害处置无隐患			
五、电缆与线路及桥架线管检查					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	电缆起始端、拐弯处是否悬挂标识牌	悬挂电缆标识牌			
2	电缆绝缘层无破损、变色、老化和烧损现象	无破损、变色、老化			
3	桥架是否有变形、锈蚀、涂层脱落	桥架无变形、锈蚀、涂层脱落			
4	桥架连接部位是否松动或缺失	连接部位无松动、缺失			
5	桥架接地线是否完好，连接点无锈蚀	接地线完好连接点无锈蚀			
6	桥架周边无积水、油污等物质	周边无积水、油污等物质			
7	桥架盖板是否完好，有无小动物进入	盖板完好无小动物进入			
8	桥架穿墙、穿楼板处的防火封堵是否完好	防火封堵完好			
9	对电线、电缆的运行温度进行测量温度是否正常	温度≤70℃			
10	电线路的绝缘阻值检测				
11	检测电缆的接线端子是否过热、氧化	接线端子无过热、氧化现象			
12	对发现的病害予以处置				
六、UPS、EPS 机头、蓄电池的检查维护					
序号	检查内容	检查标准	检查数据	是否正常	备注
1	机头外壳无破损、变形、散热孔无堵塞	外壳无破损、变形、散热孔无封堵			
2	机头指示灯状态正常	指示灯状态正常			

3	电源线、信号线等无松动、氧化	电源线、信号线无松动			
4	检查接地线连接是否可靠	接地线紧固可靠			
5	电池壳体无鼓包、漏液、极柱无腐蚀	电池无鼓包。漏液、极柱无腐蚀			
6	对机头内部进行清洁				
7	接地电阻测量	≤4 欧			
8	测量电池电压	偏差≤0.2V			
9	自动切换测试	≤0.1S 完成切换			
10	充放电试验				

七、数据检测与记录

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	母线温度测量	温度≤70℃			
2	接地电阻测量	≤4 欧			
3	三相电流不平衡度检测	≤15%			
4	出线端电压测量	允许偏差 7%			
5	剩余电流测量				

八、低压柜联络切换供电调试

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	断开重要负载，对配电系统进行切换倒闸，对供电系统的稳定性、可靠性及保护装置的动作逻辑进行测试和调整	供电系统是否稳定、可靠			
2	检查切换过程中过流、短路、欠压等保护装置是否正确动作	是否动作正确			
3	备用电源投入后,负载分配是否合理，防止局部过载	是否合理			

九、分开关分合闸实验及保养

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	确认分开关型号、额定电压/电流与系统匹配,外观无破损、锈蚀	是否与系统匹配,外观无破损、锈蚀			
2	检查操作机构是否灵活，无卡涩或异常声响	是否灵活			

3	对分开关进行分合闸试验调试、观察 触头接触是否到位，无弹跳或异响；触头分离是否彻底，机构复位是否正常	是否到位，无弹跳或异响			
十、重要负荷切换倒闸调试					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	核对重要负荷回路标识是否清晰，配电柜标签与图纸一致	是否清晰，一致			
2	对重要负荷进行切换倒闸调试，记录数 据（如电压、电流、温度），建立历史数据库以便趋势分析	是否记录数据			
十一、智能断路器调试保养					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	检查智能断路器的壳体是否变形、有裂纹，操作手柄是否灵活度	是否变形、有裂纹，操作手柄是否灵活度			
2	进行自动重合闸测试，以及过载、短路等保护性检测	保护性检测是否正常			
十二、电容器无功补偿调试保养					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	检查电容器壳体是否鼓包、漏油，表面温度	是否鼓包、漏油，表面温度<70℃			
2	对电容及相关配件进行清洁，紧固接线端子	是否清洁，接线端子是否紧固			
十三、指针仪表测量回路调试保养					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	检查外壳是否破损、显示界面是否清晰，安装垂直度（偏差≤3°）,紧固接线端子	是否破损、显示界面是否清晰，安装垂直度（偏差≤3°）			
2	测量工作电源电压，显示数据核对	数据核对是否正常			
十四、电流互 感器检 查及维 护保养					
序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注

1	检查瓷套或环氧树脂外壳是否破损、裂纹，表面清洁度（无积灰、油污)、运行温度	是否破损、裂纹，表面清洁度是否(无积灰、油污)、运行温度			
2	紧固接线端子 。排查负载是否超限,清洁散热孔，对其进行绝缘电阻测量	是否超限,清洁散热孔，绝缘电阻≥10MΩ			
3	处置相关病害				

十五、铜母线 维护保 养

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	检查母线表面氧化程度，用细砂纸打磨氧化物后 涂抹导电膏	是否氧化			
2	检查支撑绝缘子是否破损，使用红外测温仪检测接头温度	是否破损			
3	对母线的绝缘性能进行测试 。通常要求≥10MΩ（潮湿环境下≥1MΩ）。处置相关病害	是否≥10MΩ			

十六、绝缘子维护保养

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	对于绝缘子，检查瓷质或复合绝缘子表面污秽程 度，使用干燥压缩空气吹扫或软毛刷清洁	清洁绝缘子表面			
2	检查绝缘子裂纹，破损面积＞5%需更换	绝缘子是否裂纹，破损			
3	使用红外测温仪 检测接头温度。紧固连接螺栓。对其绝缘电阻进行测量。处置相关病害	接头温度绝缘电阻≥300MΩ			

十七、EPS 柜切换供电调试

序号	检查内容	检查标准	检测数据	是否正常	备注
1	断开重要负载，对 EPS 柜进行切换倒闸，对供电系统的稳定性、可靠性及保护装置的动作逻辑进行测试和调整	供电系统是否稳定可靠			
2	备用电源投入后，负载分配是否合理，防止局部过载	是否合理			

5、应急抢修记录表

大同房建公寓段

管内重点场所电气设施设备维保应急抢修记录表

报修单位		报修时间	
报修人		报修接受人	
盯控人员		抢修人员	
故障现象：			
故障原因：			
抢修情况：			
